

MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW
43-100 Tychy, ul. Budowlanych 59
tel. centr. 32/227-70-06÷07
sekretariat 32/327-14-91
fax 32/227-70-08
NIP 646-24-47-307

Działalność i finanse

Spis treści	Strona
⇒ I. Podstawowe dane finansowe o wydatkach budżetowych MZUiM	3
⇒ Wykres nr 1. Struktura wydatków budżetowych na 30.09.2024r.	4
⇒ II. Informacja opisowa MZUiM z wykonania bieżącego utrzymania i remontów dróg na 30.09.2024r.	5
⇒ III. Informacje opisowa z wykonania dochodów na 30.09.2024r.	9
⇒ IV. Informacja opisowo - finansowa z zaawansowania realizacji inwestycji drogowych na 30.09.2024r.	11


I. Podstawowe dane finansowe o wydatkach budżetowych MZUIM na 30.09.2024r.

Lp	Rodzaj wydatku	2024r.		
		Plan na dzień 30.09.2024r. zł	Wykonanie na dzień 30.09.2024r. zł,gr	Zaangażowanie na dzień 30.09.2024r. zł,gr
1	2	3	4	4
I	Inwestycje*	86 953 165,00	18 450 633,87	71 720 647,74
II	Remonty dróg i obiektów inżynierskich	20 837 853	5 320 359,30	16 815 279,33
III	Utrzymanie dróg w tym:	22 889 396	13 008 279,44	20 389 387,79
1	Letnie utrzymanie dróg	2 894 000	1 785 059,33	2 892 995,74
2	Zimowe utrzymanie dróg	9 615 802	5 865 019,95	8 364 032,14
4	Pozostałe w tym:	10 379 594	5 358 200,16	9 132 359,91
4.1	Zakup energii		1 125 976,14	1 366 301,90
4.2	Oznakowanie pionowe i poziome		518 960,18	1 748 694,69
4.3	Inne np. utrzymanie parkingów wielopoziomowych, parkomatów, oflagowanie miasta itp.		3 713 263,84	6 017 363,32
IV	Utrzymanie MZUIM i CSR	10 933 090	7 958 003,61	10 456 535,33
Razem I+II+III+IV		141 613 504	44 737 276,22	119 381 850,19

* - na sesje październikową złożono wniosek przenoszący środki na rok 2025 w wysokości 11.294.138,00 zł dot. zadań:

- 1) budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami
 - 2) rozbudowa ul. Brzoskwiniowej - projekt
 - 3) rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej
 - 4) budowa ul. Gilów na odc. od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej
 - 5) rozbudowa ul. Głównej na odcinku od ul. Urbanowickiej do posesji 133 - projekt
 - 6) rozbudowa ul. Goździków - projekt
 - 7) rozbudowa ul. Jeżynowej - projekt
 - 8) rozbudowa drogi bocznej ul. Jurajskiej 40-22 - projekt
 - 9) rozbudowa ul. Mysłowickiej - projekt
 - 10) budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniovców
 - 11) budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej - projekt
 - 12) rozbudowa ul. Sosnowej na odcinku od ul. Browarowej 4-6 - bocznej do ul. Obywatelskiej
 - 13) rozbudowa ul. Spokojnej - projekt
 - 14) rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej
 - 15) budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66 - projekt
 - 16) budowa parkingu przy ul. Cmentarnej wraz ze zjazdem - projekt
 - 17) Kompleksowy System Informacji Miejskiej
- Ponadto na grudzień 2024 planowana jest płatność za inwestycję pn: "Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej" w wysokości 32.330.141,14 zł

Wykres nr 1. Struktura wydatków budżetowych na dzień 30.09.2024.

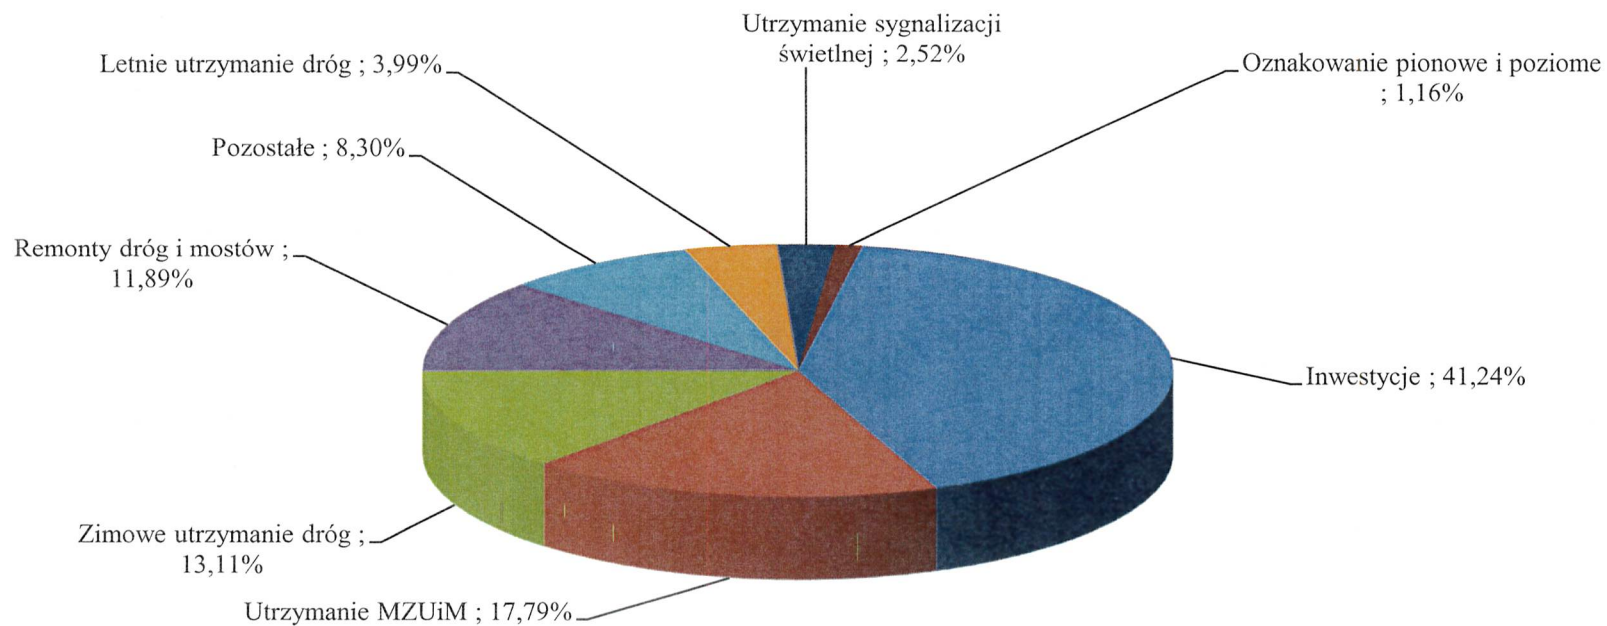

II. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA I REMONTÓW DRÓG

Lp.	NAZWA ZADANIA	Plan na 30.09.2024 r. w zł	Wykonanie na 30.09.2024 r. zł, gr	Zaangażowanie	Opis
1	2	3	4	5	6
I	DROGI KRAJOWE I POWIATOWE				
1.	Remonty dróg krajowych i powiatowych	8 428 440	1 485 616,34	7 591 742,29	<p>Z kwoty 1 485 616,34zł przypada na: Wydatkowane środki dotyczą: a) remonty nawierzchni bitumicznych: - cząstkowe - 2 341,12m2 Wykonawca: Bio-Ekos Group Sp.z o.o. sp. k. , Tychy; - nakładki Wykonawca JKM Sp. z o.o. Mikołów; Drogród Ćwiklice</p> <p>b) remont urządzeń odwodnienia ulicznego - czyszczenie wpustów - 24,0szt. - czyszczenie przykanalików - 20,0szt. - udrożnienie odwodnienia liniowego - 50,0m - uzupełnienie kratki wpustu ulicznego - 8,0szt. - wymiana wpustu ulicznego - 7,0szt. Wykonawca: EKO-OGRÓD, Tychy; UNIFOR Spółka z o.o., Imielin</p> <p>c) konserwacja rowów, poboczy i przepustów: - oczyszczenie przepustu - 38,00m - wyrównanie nawierzchni wjazdów oraz poboczy - 665,00m2 Wykonawca: BERYLBOLA, Imielin;</p> <p>d) remonty obiektów inżynierskich: - naprawa bariery ochronnej na wiadukcie kolejowym przy ul.Harcerskiej Wykonawca: Usługi Sprzętowo-Transportowe, Kobiór</p> <p>e) remont dróg gruntowo - żuźlowych - 4 730,00m2 Wykonawca: BERYLBOLA, Imielin</p> <p>f) remonty: - naprawa urządzeń przejazdu kolejowego - awaria urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na przejeździe kolejowym przy ul. Serdecznej - narawa urządzeń przejazdu kolejowego - awaria urządzeń sterowania ruchem (po dewastacji) na przejeździe kolejowym przy ul. Serdecznej - Rrmont pasa drogowego w zakresie peronów przystankowych Wykonawca: PKP PLK, INFRA-KOM, Mikołów</p>
					1 226 565,02
					55 990,02
					6 197,97
					36 900,00
					32 991,06
					126 972,27

2.	Zadanie pn. "Remont wiaduktu północnego i południowego w ciągu DK-44 nad DK-1 w Tychach /WPF/	712 500	0,00	712 206,90	Wyloniono wykonawcę robót. Podpisanie umowy - 15.X.2024r. Planowany termin zakończenia robót - I.2025r. Wykonawca: PROBUD, Tychy	0,00
3.	Bieżące utrzymanie dróg krajowych i powiatowych oraz obiektów inżynierskich	1 447 086	614 139,43	1 433 120,28	<p>Z kwoty 614 139,43zł przypada na:</p> <p>a) oznakowanie pionowe i poziome dróg Wykonawca: ROAD Sp. z o.o., Bytom</p> <p>b) utrzymanie obiektów inżynierskich - przeglądy podstawowe obiektów mostowych w 2024r. - 111 obiektów</p> <p>c) projekty i nadzór remontów: - opracowanie dokumentacji projektovej - odtworzenia dynamicznej informacji parkingowej w ramach działającego systemu ITS w rejonie G. Roweckiego - pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją remontów obiektów mostowych w 2024r. Wykonawca: DROCAD, Tychy; P-two Wielobranżowe "Grepol", Mszana</p> <p>d) zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt Wykonawca: EURO-WET, Tychy</p> <p>e) oświetlenie świąteczne - demontaż oświetlenia świątecznego -sezon 2023/2024</p> <p>f) inne - utrzymanie urządzeń odwodnienia ulicznego - czyszczenie studzienek - 768,0szt. i przykanalików - 768,0szt. - utrzymanie urządzeń srk przejazdu kolejowego w ciągu ul. Serdecznej; - naprawa drewnianych elementów ławek - opłata przyłączeniowa do sieci TAURON - wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych - wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych Wykonawca: PKP PLK, MAX DROGI, Bielsko-Biała; Usługi Sprzętowo-Transportowe, Kobiór; UNIFOR Sp. z o.o., Imielin; TAURON</p>	392 137,69 25 215,00 27 900,09 28 618,07 17 133,90 123 134,68

II DROGI GMINNE						
1.	Remonty dróg gminnych	7 091 190	664 637,97	5 243 073,26	Z kwoty 664 637,97 zł przypada na: Wydatkowane środki dotyczą: a) remonty nawierzchni bitumicznych: - cząstkowe 1 329,95m ² Wykonawca: Bio-Ekos Group Sp.z o.o. sp. k., Tychy; - nakładki Wykonawca JKM, Sp. z o.o. Mikołów; Drogród Ćwiklice	357 411,89
					b) chodniki - opinia dendrologiczna w ramach zadania remonty chodników	10 500,00
					c) remont urządzeń odwodnienia ulicznego - czyszczenie wpustów - 12,0szt. - czyszczenie przykanalików - 11szt. - ułożenie przykanalika - 16,50m - budowa studzienki ściekowej - 4,0szt. - budowa odwodnienia liniowego - 1,5m - wymiana wpustu ulicznego - 11,0szt. Wykonawca: EKO-OGRÓD, Tychy; UNIFOR Spółka z o.o., Imielin	93 280,94
					d) konserwacja rowów, poboczy i przepustów: - oczyszczenie przepustu - 34,00m - oczyszczenie rowu z namułu - 265,0m - odtworzenie rowu - 280,0m - wyrównanie nawierzchni wjazdów oraz poboczy - 1 098,00m ² Wykonawca: BERYLBOLA, Imielin;	12 210,83
					e) remont dróg gruntowo - żuźlowych - 25 075,0m ² Wykonawca: BERYLBOLA, Imielin	191 234,31
2.	Remont kładki ul. Darwina	1 500 000	445 297,60	1 204 286,90	Zadanie w fazie realizacji. Umowę podpisano - 09.IV. 2024r. Zadanie I (zakres kładki) - zadanie zakończone. Planowany termin zakończenia robót zadanie II (zakres układu drogowego) - X.2024r. Zakres rzeczowy: - kładka - wykonano nową nawierzchnię na kładce; wykonano odbudowę skrzydła tunelu; zostały zamontowane balustrady; Zaawansowanie robót: - układ drogowy - roboty w końcowej fazie - zabezpieczono siatką dwa przejście podziemne wraz z zamknięciem wejść do przejść podziemnych; wykonano kratę stalową zamykającą wejście do przejścia podziemnego od strony kładki; wykonano nowe schody – zejścia na kładkę od strony al. Jana Pawła II; zakończono roboty związane ze zmianą organizacji ruchu, tj. wykonano zawężenie jednego pasa ruchu na obu kierunkach; wykonano w pasie rozdziálu przejście dla pieszych; trwają prace porządkowe; wykonano oznakowanie poziome; w przygotowaniu montaż balustrad i obróbek blacharskich na murkach Wykonawca zadanie I: PRUiM SA, Gliwice Wykonawca zadanie II: INFRA-KOM, Łędziny	445 297,60

3.	Remont ul. Borowej	2 174 000	2 169 685,60	2 169 685,60	Zadanie zakończone Zakres rzeczowy : wykonano remont chodnika na powierzchni 2 220m ² ; wykonano nawierzchnię bitumiczną 8 890m ² ; oznakowanie poziome i pionowe Wykonawca: JKM Sp. Z o.o., Mikołów	2 169 685,60
4.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i obiektów inżynierskich	1 069 100	265 078,36	1 058 901,86	Z kwoty 265 078,36 zł przypada na:	
					a) oznakowanie pionowe i poziome dróg Wykonawca: ROAD Sp. z o.o., Bytom	126 822,49
					b) zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt Wykonawca: EURO-WET, Tychy	14 307,08
					d) inne - utrzymanie urządzeń odwodnienia ulicznego - czyszczenie studzienek - 221,0szt. i przykanalików - 221,0szt. - naprawa drewnianych elementów ławek - opłata przyłączeniowa do sieci TAURON - uzgodnienia branżowe Wykonawca: Usługi Sprzętowo-Transportowe, Kobiór; TAURON; UNIFOR Sp. z o.o., Imielin; PKP PLK; GPW; Wody Polskie	123 948,79
III BUDŻET OBYWATELSKI						
1.	Remont chodnika wzdłuż ul. Hetmańskiej 1-8	254 000	0,00	194 235,39	Zadanie zakończone. Zakres rzeczowy: wykonano nową nawierzchnię chodnika na dł.ok. 197,0m; słupki separacyjne - 5szt. Wykonawca: SOLIDMAT-BRUK, Tychy	0,00
2.	Remont drogi przy ul. Nałkowskiej (strona północna)	75 000	45 003,24	45 003,24	Zadanie zakończone. Zakres rzeczowy: nowa nawierzchni bitumiczna na odc. długości około 51,0m (odc. wzdłuż bud. TSM Oskard) Wykonawca: JKM Sp. z o.o., Mikołów	45 003,24
3.	Remont drogi przy ul. Zaręby 13-29	152 596	133 357,41	133 357,41	Zadanie zakończone. Zakres rzeczowy: ułożono nową nawierzchnię bitumiczną na całej szerokości jezdni, na odc. od skrzyżowania z ul. Zelwerowicza do skrzyżowania z sięgaczem za budynkiem Nr 29-35 Wykonawca: DROGRÓD, Ćwiklice	133 357,41

III. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2024 ROKU

Lp	NAZWA ZADANIA	Plan na 2024r. (wg stanu na dzień 30.09.2024r.) (zł)	Wykonanie (zł, gr)	% Wyk. Planu (4/3)	Opis
1	2	3	4	5	6
I	Dział 600 - Transport i łączność	580 000	983 605,40	169,59%	
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne powiatowe				
1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	580 000	0,00	0,00%	Na wpływy z innych lokalnych opłat składają się: a) opłata za zajęcie pasa drogowego b) opłaty za umieszczanie reklam w pasie drogowym
2	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych § 0570	0	119 759,18	-	Na wpływy z innych lokalnych opłat składają się: a) kara za brak opłaty za przejazd nienormalny b) kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia
3	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0580	0	94 160,00	-	Na wpływy z innych lokalnych opłat składają się: a) kara za brak opłaty za przejazd nienormalny
4	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość § 0620	0	689 709,21	-	Na wpływy z innych lokalnych opłat składają się: a) opłata za zajęcie pasa drogowego b) opłaty za umieszczanie reklam w pasie drogowym c) opłaty za przejazd nienormalny
5	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640	0	144,00	-	Koszty upomnienia
6	Wpływy z opłaty prolongacyjnej § 0880	0	330,00		Opłata prolongacyjna
7	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek § 0920	0	2 718,24	-	Odsetki od nieterminowych wpłat
8	Zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych § 0940	0	11 712,00	-	Zwrot z tyt. zwrotu wydatków z lat ubiegłych
9	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950	0	65 072,77	-	Wpływy z tytułu odszkodowań
II	Dział 600 - Transport i łączność	325 200	282 913,96	87,00%	
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne				
1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	324 000	0,00	0,00%	Na wpływy z innych lokalnych opłat składają się: a) opłata za zajęcie pasa drogowego b) opłaty za umieszczanie reklam w pasie drogowym
2	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość § 0620	0	280 955,15	-	Na wpływy z innych lokalnych opłat składają się: a) opłata za zajęcie pasa drogowego b) opłaty za umieszczanie reklam w pasie drogowym c) opłaty za przejazd nienormalny
3	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640	0	128,00	-	Koszty upomnienia
4	Wpływy z pozostałych odsetek § 0920	0	102,78	-	Odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki bankowe
5	Zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych § 0940	0	697,29	-	Na zwroty wydatków składają się: a) zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych b) zwrot rozliczenie podatku VAT dotyczących wydatków z roku poprzedniego
6	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950	0	1 030,74	-	Na wpływy z tytułu kar i odszkodowań składają się: a) wpływy z tytułu kar umownych b) wpływy z tytułu odszkodowań
7	Wpływy z różnych dochodów § 0970	1 200	0,00	0,00%	Opłata za zarządzanie drogą usytuowaną na działce należącej do TTBS
III	Dział 600 - Transport i łączność	951 600	1 041 265,10	109,42%	
	Rozdział 60019 - płatne parkowanie				
1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	520 000	720 550,05	138,57%	Na wpływy z tytułu kar i odszkodowań składają się: a) opłata za bilety parkingowe jednorazowe i okresowe (475.496,85 zł) b) opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty parkingowej (245.053,20 zł)
2	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych § 0570	200 000	0,00	0,00%	Kara za nieopłacenie opłaty parkingowej
3	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640	0	40 494,76	-	Koszty upomnienia

4	Zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych § 0940	0	6 825,32	-	Na zwroty wydatków składają się: a) zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych b) zwrot rozliczenie podatku VAT dotyczących wydatków z roku poprzedniego
5	Wpływy z różnych dochodów § 0970	231 600	273 394,97	118,05%	Na wpływy z różnych dochodów składają się: a) udział w przychodach ze sprzedaży oferty Taryfy Pomarańczowej- dot. parkingów wielopoziomowych b) wpływy z tyt. opłat za korzystanie z parkingów wielopoziomowych
IV	Dział 600 - Transport i łączność Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 500	9 375,00	75,00%	
1	Wpływy z usług § 0830	12 500	9 375,00	75,00%	Opłata za funkcjonowanie nazwy przystanku
V	Dział 600 - Transport i łączność Rozdział 60095 - Drogi publiczne gminne	0	327 931,76	0	
1	Zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych § 0940	0	277,28	-	Zwrot z tyt. zwrotu wydatków z lat ubiegłych
2	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950	0	327 654,48	-	Wpływy z tytułu odszkodowań
VI	Dział 750 - Administracja publiczna Rozdział 75023 - Urzędy Gmin	273 000	355 910,00	130,37%	
1	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640	0	80,00	-	Koszty upomnienia
2	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 0750	273 000	325 537,58	119,24%	Dzierżawa nieruchomości gruntowej
3	Wpływy z pozostałych odsetek § 0920	0	7 962,78	-	Wpływy z tytułu odsetek
4	Zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych § 0940	0	21 016,26	-	Na zwroty wydatków składają się: a) zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych b) zwrot rozliczenie podatku VAT dotyczących wydatków z roku poprzedniego
5	Wpływy z różnych dochodów § 0970	0	1 313,38	-	Na wpływy z różnych dochodów składają się: a) wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego i dla płatnika świadczeń z ubezpieczenia chorobowego b) pozostałe wpływy
Razem I+II+III+IV+V+VI		2 142 300,00	3 001 001,22	140,08%	

IV. INFORMACJA FINANANSOWA Z ZAAWANSOWANIA REALIZACJI INWESTYCJI DROGOWYCH NA 30.09.2024R.

Lp.	Zadanie	Podjęte działania	Plan na 30.09.2024r.	Wykonanie na 30.09.2024r.
1.	Rozbudowa ul. Brzoskwiniowej - projekt (WPF)	Prace projektowe w toku Umowę podpisano - 04.IV.2023r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 2025 r Planowane przedłużenie terminu zakończenia prac projektowych -II/III kw.2025r. Złożono wniosek o przeniesienie środków na 2025 rok. Wykonawca dokumentacji: Inżynieria Jerzy Sowa,Trzebinia	172 200,00	0,00
2.	Rozbudowa ul. Długiej na odcinku od ul. Wspólnej do S-1 (WPF)	Decyzja ZRID w posiadaniu Zamawiającego. Uprawnoczone pozwolenie wodnoprawne w posiadaniu MZUiM. Wykonawca: DROCAD Sp. z o.o., Tychy. Planowany termin uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót - I/II kw. 2025r.	25 000,00	11 070,00
3.	Rozbudowa ul. Jezynowej - projekt (WPF)	Prace projektowe w toku. Umowę podpisano – 11.V.2023r. Planowany termin zakończenia prac projektowych – 2025r. Złożono wniosek o przeniesienie środków na 2025 rok. Wykonawca: ROADPRO, Rybnik	90 000,00	0,00
4.	Rozbudowa drogi bocznej ul. Jurajskiej 40-22 - projekt (WPF)	Prace projektowe w toku. Umowę podpisano – 05.VI.2023r. Planowane przedłużenie terminu zakończenia prac projektowych - II kw. 2025r. Złożono wniosek o przeniesienie środków na 2025 rok. Wykonawca: Inżynieria J. Sowa,Trzebinia	149 000,00	19 311,00
5.	Budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami (WPF)	Zadanie w fazie realizacji. Umowę podpisano - 15.III.2024r. Planowany termin zakończenia robót - 2025r. Zaawansowanie robót : zakończono budowę kanalizacji deszczowej na sięgaczach. Trwa budowa kanalizacji deszczowej w ciągu głównym ul. Browarowej. W toku prace elektroenergetyczne i związane z budową kanału teletechnicznego; uzgodniony projekt przebudowy sieci wodociągowej i gazowej został przekazany Wykonawcy. Złożono wniosek o przeniesienie środków na 2025 rok. Wykonawca: AN-EKO,Tychy	2 600 000,00	302 687,52
6.	Rozbudowa ul. Sosnowej na odc. od ul. Browarowej 4-6 - bocznej do ul. Obywatelskiej (WPF)	Zadanie w fazie realizacji. Umowę podpisano - 15.III.2024r. Planowany termin zakończenia robót - 2025r. Zaawansowanie robót : uzgodniony projekt przebudowy sieci wodociągowej i gazowej został przekazany Wykonawcy; zdemontowano ogrodzenie zgodnie z projektem Złożono wniosek o przeniesienie środków na 2025 rok. Wykonawca: AN-EKO,Tychy	800 000,00	1 500,00
7.	Przebudowa ul. Elsnera	Zadanie zakończone. Zakres rzeczowy: jezdnia asfaltowa drogi pożarowej – 436,76 m2; zieleniec wzmocniony geokratą – 462,34 m2; chodniki o nawierzchni z kostki brukowej – 109,42 m2; dren francuski fi100 – 125,12 m; kanalizacja deszczowa; oświetlenie uliczne -latarnie 3,00 szt.; oznakowanie pionowe i poziome; regulacja urządzeń obcych; zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych; demontaż nieczynnej sieci ciepłowniczej Wykonawca: General Development Sp. z o.o.,Tarnowskie Góry	783 924,00	772 518,94
8.	Budowa ul. Piaskowej (WPF)	Zadanie zakończone. Zakres rzeczowy: droga dł. 1,35 km – o nawierzchni bitumicznej; 6 wyniesionych tarcz skrzyżowań; chodnik obustronny o nawierzchni z kostki brukowej – 3,25 km; kanalizacja deszczowa; oświetlenie uliczne; kanał technologiczny; przebudowano - sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i kanał teletechniczny Wykonawca: Konsorcjum - DROGRÓD Ćwiklice i EKO-OGRÓD, Tychy	4 009 416,00	4 003 286,82

Lp.	Zadanie	Podjęte działania	Plan na 30.09.2024r.	Wykonanie na 30.09.2024r.
9.	Rozbudowa ul. Spokojnej - projekt (WPF)	Prace projektowe w toku. Umowę podpisano – 11. VII.2023r. Planowane przedłużenie terminu zakończenia prac projektowych - II/III kw. 2025r. Złożono wniosek o przeniesienie środków na 2025 rok. Wykonawca: Inżynieria Jerzy Sowa, Trzebinia	196 000,00	0,00
10.	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej wraz ze zjazdem - projekt	Prace projektowe w toku. Umowę podpisano – 04. VI.2024r. Planowane przedłużenie terminu zakończenia prac projektowych - II kw. 2025r. Złożono wniosek o przeniesienie środków na 2025 rok. Wykonawca: Konsorcjum: Inżynieria KSK Sp. z o.o., Trzebinia i Inżynieria Drogowa Szymon Tokarz, Myślachowice	114 700,00	0,00
11.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Strefowej od ul. Cielmickiej do ul. Serdecznej - środki miasta	Zadanie w fazie realizacji. Umowę podpisano – 28. V.2024r. Planowany termin zakończenia robót – X.2024r. Zaawansowanie robót: na ok. połowie zakresu została ułożona nawierzchnia chodnika - 70% zakresu; układane są w-wy konstrukcyjne na pozostałym zakresie; na ok. 50% zakresu została ułożona nawierzchnia bitumiczna ścieżki rowerowej Wykonawca: JKM Sp. zo.o., Mikołów	1 009 474,00	419 734,06
	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Strefowej od ul. Cielmickiej do ul. Serdecznej - środki GZM		1 987 580,00	469 592,09
12.	Rozbudowa ul. Szkolnej na odc. od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej (WPF)	Prace projektowe w toku. Umowę podpisano - 05. V.2021r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - IV kwartał 2024 r. Obecnie procedowany jest wniosek o wydanie decyzji ZRID. Planowane ogłoszenie przetargu w IV kwartale 2024r. Złożono wniosek o przeniesienie środków na 2025 rok. Wykonawca dokumentacji projektowej: INVEST-MAP Łukasz Muzyk, Katowice	6 000 000,00	68 634,00
13.	Budowa parkingu przy ul. Witosa i ul. Sikorskiego (w 2023r. BO)	Po opracowaniu przez SM "Weronika" dokumentacji projektowej zostanie uruchomiona procedura wyłonienia wykonawcy robót	256 539,00	0,00
14.	Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Nałkowskiej	Zadanie zakończone. Zakres rzeczowy: przy ul. Nałkowskiej – 30 miejsc postojowych prostopadłego parkowania, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych; 3 miejsca postojowe równoległego parkowania; chodnik. Parking za Orionem – 45 miejsc parkingowych, w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych; droga manewrowa; chodnik; plac rozładunkowy o nawierzchni bitumicznej; oświetlenie (4 latarnie); kanalizacja deszczowa; wyniesione przejście dla pieszych przez ul. Nałkowskiej; oznakowanie pionowe i poziome. Wykonawca: P-two Budowlano-Drogowe „Drokan-1” Sp. z o.o., Tychy	53 338,00	53 257,40
15.	Budowa ul. Spacerowej (WPF)	Zadanie zakończone. Trwają czynności odbiorowe i usuwanie usterek Zakres rzeczowy: jezdnia o nawierzchni bitumicznej składa się z trzech odcinków: odc. nr 1 - od skrzyżowania z Małą Aleją Róż kończy się włączeniem do istniejącej jezdni biegnącej wzdłuż potoku Tyskiego; odc. nr 2 od km 0+101,9 odcinka nr 1 i przebiega w kierunku wschodnim; odc. nr 3 przebiega w kierunku południowym. Odcinki nr 2 i 3 są bez przejazdu; skrzyżowania odcinków nr 1 i nr 2 oraz nr 2 i nr 3 zaprojektowano w formie wyniesionych skrzyżowań o nawierzchni z kostki brukowej; wzdłuż odcinka nr 1 i nr 3 zaprojektowano jednostronny chodnik, na części odcinka nr 2 chodnik przebiega po obu stronach; wykonane zostały zjazdy doposażone, oświetlenie uliczne, odwodnienie i kanał technologiczny. Wykonawca: AN-EKO, Tychy	1 223 000,00	1 097 835,62
16.	Budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej - projekt (WPF)	Rezygnacja z przedmiotowego zadania, złożono w tym zakresie wnioski na sesję.	100 000,00	0,00
17.	Budowa ul. Palmowej (WPF)	Zadanie zakończone. Zakre rzeczowy: droga dł. 0,93 km o nawierzchni bitumicznej; 4 wyniesione tarcze skrzyżowań oraz 4 progi zwalniające; chodnik o nawierzchni z kostki brukowej – 1,46 km; kanalizacja deszczowa; oświetlenie uliczne; kanał technologiczny; przebudowano - wodociąg, kanalizację sanitarną i - kanał teletechniczny Wykonawca: Konsorcjum - DROGRÓD Ćwiklice i EKO-OGROD, Tychy	2 162 288,00	2 156 394,64

Lp.	Zadanie	Podjęte działania	Plan na 30.09.2024r.	Wykonanie na 30.09.2024r.
18.	Budowa ul. Giłw na odc. od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej -projekt (WPF)	Zadanie w fazie realizacji. Umowę podpisano - 10.IX.2024r. Planowany termin zakończenia robót - VII.2025r. Złożono wniosek o przeniesienie środków na 2025 rok. Wykonawca: Eko-Ogród,Tychy		
19.	Rozbudowa ul. Goździków (WPF)	Prace projektowe w toku. Umowę podpisano - 27.VII.2022r. Planowane przedłużenie terminu zakończenia prac projektowych - I kw. 2025r. Złożono wniosek o przeniesienie środków na 2025 rok. Wykonawca dokumentacji projektowej: CREOTEC Sp. z o.o., Katowice	1 552 295,00	52 275,00
20.	Rozbudowa ul. Jankowickiej - projekt (WPF)	Zakończono prace projektowe. W VII.2024r. została złożona do Wydziału Budownictwa dokumentacja projektowa w celu uzyskania decyzji administracyjnej - ZRID Obecnie procedowany jest wniosek o wydanie decyzji. Wykonawca dokumentacji projektowej: Biuro Inżynieryjne MK Sp. j. M.Krawczyk,K. Strzyżyk, Oświęcim	65 432,00	0,00
21.	Budowa ul. Wilkowyjskiej - projekt (WPF)	Zakończono prace projektowe. Dokumentacja projektowa i decyzja ZRID w posiadaniu MZUiM Wykonawca dokumentacji projektowej: DROCAD, Tychy	8 000,00	0,00
22.	Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 14-44 - projekt (WPF)	Prace projektowe w toku. Umowę podpisano – 31.V.2023r. Dokumentacja projektowa została złożona do Wydziału Budownictwa w celu uzyskania decyzji administracyjnej - procedowany jest wniosek o wydanie decyzji. Wykonawca dokumentacji projektowej: ABS Ochrona Środowiska Spółka z o.o., Katowice	45 387,00	45 387,00
23.	Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66 - projekt (WPF)	Prace projektowe w toku. Umowę podpisano - 27.X.2022 r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 2025 r. Złożono wniosek o przeniesienie środków na 2025 rok. Wykonawca dokumentacji projektowej: DROCAD, Tychy	97 000,00	51 168,00
24.	Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego (WPF)	Dokumentacja projektowa i decyzja ZRID w posiadaniu MZUiM. Brak jest w budżecie całości środków na realizację zadania. Ze względu na duży koszt robót, będziemy czynili starania o przyznanie dofinansowania ze środków zewnętrznych. Planowany termin uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót - po uzyskaniu odpowiednich środków finansowych	124 950,00	12 423,00
25.	Budowa Metropolitalnej drogi rowerowej (Velostrada nr 3) w obszarze GZM (Katowice-Tychy) na terenie Gminy Tychy - środki GZM (WPF)	Opracowano program funkcjonalno - użytkowy Wykonawca: DROCAD Spółka z o.o., Tychy Koszt PFU: 273 060,00 zł Przyznano dofinansowanie z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii na PFU cz. 1 w wysokości 40 959,00 zł Przyznano dofinansowanie z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii na PFU cz. 2 w wysokości 232 101,00 Trwa przygotowanie dokumentów do podpisania Umowy o dofinansowanie. Podpisano Umowę Partnerską między Górnośląsko - Zagłębiowską Metropolią, Gminą Katowice i Gminą Tychy.	50 000,00	0,00
			232 101,00	177 489,00

Lp.	Zadanie	Podjęte działania	Plan na 30.09.2024r.	Wykonanie na 30.09.2024r.
26.	Przebudowa ul. Budowlanych w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od nr 166 do ul. Wojska Polskiego - środki GZM	Zadanie zakończone Zakres rzeczowy: chodnik o nawierzchni z kostki brukowej - 347,60m ² ; ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej - 409,40m ² ; oznakowanie pionowe i poziome; ze względu na okres wegetacji drzewa i krzewy zostaną nasadzone do 30.XI.2024r. Wykonawca: P-two Budowlano-Projektowe "Drokan-2", Tychy	409 829,00	306 571,04
	Przebudowa ul. Budowlanych w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od nr 166 do ul. Wojska Polskiego - środki miasta		40 984,00	0,00
27.	Przebudowa ul. Burschego w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej od ul. Budowlanych do ul. Hłonda - środki GZM	Zadanie w fazie realizacji. Umowę podpisano 06.V.2024r. Planowany termin zakończenia robót - XI.2024r. Zaawansowanie robót: na odc. od ul. Budowlanych do kościoła ułożono warstwy konstrukcyjne pod ciąg pieszo-rowerowy (podbudowa przygotowana do ułożenia nawierzchni bitumicznej); wykonano odwodnienie - 4 wpusty z przykanalikami; wykonano oznakowanie poziome przy ul. Hłonda; złożono do Wydziału Budownictwa dokumentację projektową na budowę ścieżki rowerowej na działce nr 1099/64 - trwa procedowanie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę Wykonawca: DROKAN-2, Tychy	677 445,00	498 141,02
	Przebudowa ul. Burschego w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej od ul. Budowlanych do ul. Hłonda - środki miasta		117 745,00	0,00
28.	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Cielmickiej od ul. Towarowej do ul. Strefowej - środki GZM	Zadanie zakończone Zakres rzeczowy: ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej dł. ok. 360,00m ; nawierzchnia z kostki brukowej przystanku komunikacji miejskiej 34,26m ² ; oznakowanie pionowe i poziome; regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury podziemnej; inwentaryzacja geodezyjna	680 692,00	680 692,00
	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Cielmickiej od ul. Towarowej do ul. Strefowej - środki miasta	powykonawcza Wykonawca: EKO-OGRÓD, Tychy	7 161,00	7 160,54
29.	Przebudowa ul. Harcerskiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od ul. Zwakowskiej do ul. Stoczniowców oraz przebudowa chodnika - środki GZM	Zadanie w fazie realizacji. Umowę podpisano - 14.V.2024r. Planowany termin zakończenia robót - X.2024r.	1 815 705,00	466 507,87
	Przebudowa ul. Harcerskiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od ul. Zwakowskiej do ul. Stoczniowców oraz przebudowa chodnika - środki miasta	Zaawansowanie robót: wykonano chodnik na 50% zakresu; trwają dalsze prace związane z budową chodnika oraz ścieżki rowerowej - wykonano warstwy konstrukcyjne na 80% zakresu Wykonawca: EKO-OGRÓD Z.F. Konserwacja Terenów Zielonych, Tychy	242 481,00	100 232,70
30.	Przebudowa ul. Towarowej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od nr 50 do planowanego ronda przy ul. Cielmickiej - środki GZM	Zadanie zakończone. Zakres rzeczowy: chodnik o nawierzchni z kostki brukowej (475,01m ²); ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej w kolorze czarnym (409,32m ²); opieracze (4 szt.); oznakowanie poziome; inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	380 297,00	360 741,13
	Przebudowa ul. Towarowej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od nr 50 do planowanego ronda przy ul. Cielmickiej - środki miasta	Wykonawca: AN-EKO, Tychy	38 031,00	0,00
31.	Rozbudowa ul. Głównej na odc. od ul. Urbanowickiej do posesji 133 - projekt (WPF)	Prace projektowe w toku. Umowę podpisano - 18.IV.2023 r. Planowane przedłużenie terminu zakończenia prac projektowych - III kw. 2025r. Złożono wniosek o przeniesienie środków na 2025 rok. Wykonawca dokumentacji: Biuro Inżynierskie MK Oświęcim	173 800,00	0,00
32.	Rozbudowa ul. Lokalnej - środki z subwencji ogólnej budżetu państwa (WPF)	Zadanie w fazie realizacji. Umowę podpisano - 08.11.2023r.	552 217,00	0,00
	Rozbudowa ul. Lokalnej (zadanie: Budowa kładki dlapieszch i rowerów nad potokiem Tyskim) - środki z subwencji ogólnej budżetu państwa (WPF)	Planowany termin zakończenia robót - XI.2024r.	5 643 160,00	900 086,46
	Rozbudowa ul. Lokalnej - środki miasta (WPF)	Zaawansowanie robót: ukończono prace związane budową wodociągu; w trakcie prace ziemne w kolicach ronda; na ukończeniu budowa kanalizacji deszczowej; zakończono budowę sieci oświetleniowej w rejonie rond; w trakcie realizacji oświetlenie na odc. od ronda w kierunku granicy gminy wykonano przyczółki oraz płytę obiektu mostowego (kładka); wykonano umacnianie płytami ażurowymi koryta potoku pod kładką i obiektem mostowym; zakończono prace związane z przewiertem pod kanałem kanalizacji sanitarnej; w trakcie prace związane z przełożeniem sieci energetycznej; zakończono układanie kanalizacji deszczowej - odc. tłoczny; sfrezowano nawierzchnie na około 50% zakresu; rozpoczęto montaż zbiornika przepompowni; na ukończeniu realizowane jest zabezpieczenie kanałów sanitarnych; wykonano stabilizację podłoża na około 40% zakresu; w trakcie realizacja przebudowy sieci teletechnicznej; wykonano około 20% podbudowy MCE; wykonano prace brukarskie w rejonie ronda Lokalna; rozpoczęto budowę parkingu i zjazdów do Firmy Master	4 417 783,00	2 328 564,90
	Rozbudowa ul. Lokalnej - (zadanie: Budowa kładki dlapieszch i rowerów nad potokiem Tyskim) - środki miasta (WPF)	Wykonawca: Silesia Invest Spółka z o.o.sp. k., Gliwice	4 970 000,00	0,00

Lp.	Zadanie	Podjęte działania	Plan na 30.09.2024r.	Wykonanie na 30.09.2024r.
33	Rozbudowa ul. Mysłowickiej - projekt (WPF)	W przygotowaniu materiały do wszczęcia procedury wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. Planowany termin wszczęcia procedury - I/II kwartał 2025r. Złożono wniosek o przeniesienie środków na 2025 rok.	100 000,00	0,00
34	Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu (WPF) - środki miasta Tychy	Ostateczna Decyzja ZRID w posiadaniu MZUiM. Wykonawca dokumentacji projektowej: BSIPK Katowice Podpisano porozumienie z Gminą Bieruń w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu współfinansowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.03 Fundusze Europejskie dla zrównowazonej mobilności, Działanie FESL.03.03 Regionalne trasy rowerowe – ZIT Planowany termin wszczęcia procedury wyłonienia wykonawcy robót – po uzyskaniu dofinansowania	682 959,00	0,00
35.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Dąbrowskiego od ul. Darwina do ul. Wyszynskiego (WPF)	Zadanie zakończone. Zakres rzeczowy: chodnik na dojeźdźcach do parkingów i przy przejściach dla pieszych: o nawierzchni z kostki brukowej (217,05m2); o nawierzchni mineralno-żywiczej (31,12m2); ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej dl. ok. 500,00m (1 570,00m2); stojaki rowerowe (4 szt.); słup ogłoszeniowy (1 kpl.); nasadzenie drzew (8 szt.) i krzewów (1 401,0 szt.); oznakowanie pionowe i poziome; regulacja wysokościowa istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej; zabezpieczenie istniejących sieci; roboty geodezyjne. Wykonawca: General Development Sp. z o.o., Tarnowskie Góry	1 149 424,00	1 147 883,53
36.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Harcerskiej od ul. Begonii do ul. Zwakowskiej	Zadanie zakończone. Zakres rzeczowy: wykonano nawierzchnię chodnika i nawierzchnię bitumiczną na ścieżce rowerowej n; oznakowanie poziome Wykonawca: EKO-OGRÓD Z.F. Konserwacja Terenów Zielonych, Tychy	96 779,00	15 517,56
37.	Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem (WPF)	Dokumentacja projektowa i decyzja ZRID w posiadaniu MZUiM. Wyprzedzająco wykonano wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. Procedura przetargowa wyłonienia wykonawcy robót w toku. Planowany termin otwarcia ofert - 30.X.2024r. Wykonawca dokumentacji: Biuro Projektów Szafron Szendzielorz Projekt, Studzienice	1 000 000,00	153 135,00
38.	Rozbudowa al. Bielskiej w zakresie ciągu pieszo-rowerowego na odc. od ul. Oświęcimskiej do ul. Edukacji - projekt (WPF)	Prace projektowe w toku. Umowę podpisano – 20.VIII.2024r Planowany termin zakończenia prac projektowych – III.2025 r. Wykonawca: Biuro Studiów i Projektów Komunikacji Sp. z o.o. Katowice	100 000,00	0,00
39.	Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców - projekt (WPF)	Wszczęcie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej nastąpi po ogłoszeniu przetargu przez PKP na modernizację linii kolejowej nr 139 Planowany termin wszczęcia procedury - I/II kw 2025r. Złożono wniosek o przeniesienie środków na 2025 rok.	300 000,00	0,00
40.	Budowa połączenia ul. Strzeleckiej z ul. Bieruńską - projekt (WPF)	Prace projektowe w toku. Umowę podpisano - 06.V.2024 r. Planowany termin zakończenia prac projektowych – XI.2025 r. Wykonawca dokumentacji: DROCAD Sp. z o.o., Tychy	100 000,00	0,00
41.	Przebudowa ul. Burszego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską (WPF)	Zadanie zakończone - trwają czynności odbiorowe Zakres rzeczowy: chodnik o dl. 300m o nawierzchni z kostki brukowej, ciąg rowerowy o dl. 316 m o nawierzchni bitumicznej oraz ciąg pieszo-rowerowy o dl. 170m o nawierzchni bitumicznej. zabezpieczono istniejące sieci, wybudowano kanał teletechniczny Wykonawca: EKO-OGRÓD Konserwacja Terenów Zielonych, Tychy	1 056 000,00	852 204,79

Lp.	Zadanie	Podjęte działania	Plan na 30.09.2024r.	Wykonanie na 30.09.2024r.
42.	Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej (WPF)	Zadanie w fazie realizacji. Umowę podpisano - 05.02.2024r. Planowany termin zakończenia robót - 2025r. Zaawansowanie robót : odcinek ul. Wiązowej i od Wiązowej do Zwierzynieckiej wykonany w 90%; odcinek Brzoskwiniowa - Cytrynowa - wykonano 95% robót na tym odcinku; prace na ul. Zwierzynieckiej wykonano w 50%; zakończono układanie warstw konstrukcyjnych na odc. od Oświęcimskiej do Lawendowej; na ukończeniu prace związane z budową odwodnienia - wpustów, studni oraz przykanalików w ciągu ul.Czarnej; w trakcie układanie nawierzchni bitumicznej. Złożono wnioski o przeniesienie środków na 2025 rok. Wykonawca: Eko-Ogród Z. F.Konserwacja Terenów Zielonych,Tychy	2 650 000,00	726 971,56
43.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka (WPF)	Dokumentacja projektowa i decyzja ZRID w posiadaniu MZUiM. Zadanie wprowadzono do planu na realizację robót na lata 2024/2025. W przygotowaniu procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót. Planowany termin wszczęcia procedury - X.2024r.	1 000 000,00	0,00
44.	Przebudowa odcinka ul.Katowickiej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - projekt	Prace projektowe w toku. Umowę podpisano - 23.VIII.2024r. Planowany termin zakończenia prac projektowych – XII.2024r. Wykonawca dokumentacji: DROCAD Sp. z o.o., Tychy	135 300,00	0,00
45.	Przebudowa ul. G. Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do ul. Jana Pawła II (WPF)	Procedura przetargowa wyłonienia wykonawcy robót w toku. W dniu 07.X.2024r.nastąpiło otwarcie złożonych ofert. Trwa badanie złożonych ofert. Wykonawca dokumentacji projektowej: DROCAD, Tychy	1 000 000,00	53 013,00
46.	Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej (WPF) - środki miasta	Dokumentacja projektowa i decyzja ZRID w posiadaniu MZUiM. Zadanie wprowadzono do planu na realizację robót na lata 2024/2025.	14 785 275,00	82 712,86
	Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej (WPF) - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	W przygotowaniu procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót. Planowany termin wszczęcia procedury - X.2024r.	17 627 579,00	0,00
47.	Kompleksowy System Informacji Miejskiej (WPF)	Prace projektowe w toku. Umowę podpisano - 04.IX.2024r. Planowany termin zakończenia prac projektowych oraz realizacji - 2025r. Złożono wnioski o przeniesienie środków na 2025 rok. Wykonawca: PPU LINIA S.C., Wrocław	600 000,00	0,00
48.	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Brzozowej 39-45 (BO)	Zadanie zakończone. Zakres rzeczowy: wyniesione przejście dla pieszych o nawierzchni bitumicznej; oznakowanie poziome; regulacja wysokościowa przylegającego chodnika; Wykonawca: INFRA-KOM, Łędziny	46 395,00	35 945,40
49.	Budowa chodnika łączącego ul. Wyszynskiego z ul. Paprociańską (BO)	Procedura wyłonienia wykonawcy robót w toku. Planowany termin otwarcia ofert - 22.X.2024r. Planowany termin podpisania umowy około 25.X.2024r. Planowany termin zakończenia robót XI.2024r.	103 500,00	0,00
50.	Zakup wraz z montażem wiaty autobusowej przy ul.Cmentarnej obok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 (BO)	Zadanie zakończone. Zakres rzeczowy: peron pod wiatę przystankową o nawierzchni z kostki brukowej; montaż wiaty przystankowej Wykonawca: Usługi Sprzętowo-Transportowe E. Kubińska, Kobiór	25 000,00	19 988,42
51.	Zakup wraz z montażem wiat rowerowych na terenie miasta (BO)	Zadanie zakończone Zaawansowanie robót: zamontowano wiaty rowerowe w poniższych lokalizacjach: - Niepodległości - przy bibliotece miejskiej i przy "Tęczu" - G. Roweckiego - przy skrzyżowaniu z Niepodległości - Bielska - przy Hurtowni Papierniczej - Czereśniowa - przy stacji PKP Tychy Zachodnie Wykonawca: EL-PRZEM Sp. z o.o., Łabiszyn.	320 000,00	0,00
